

Point d'étape sur l'avancée des travaux à Verfeil

N°13
sept. 2024


Dans le cadre des travaux d'aménagement à 2x2 voies de l'A680, le chantier du nouvel échangeur de Verfeil se poursuit. La construction du nouveau giratoire sud sur la RD 112, désormais en service, représente une étape clé sur ce secteur. Les équipes poursuivent la construction de plusieurs ouvrages de transparence hydraulique et d'aménagement en faveur de l'environnement.

Le giratoire sud terminé

Depuis la fin du mois d'août, **les travaux sur le giratoire sud sont terminés**. Grâce à la mise en place d'un dispositif d'alternat, la circulation sur la RD112 a pu être maintenue tout au long des travaux, évitant ainsi une fermeture prolongée.

Les travaux de construction du pont de franchissement de la RD 112 sous l'A680 (le PI 87) ont démarré. Depuis, les remblais d'accès ont été réalisés.

De nouveaux alternats seront mis en place ultérieurement, notamment pour la construction du Passage Inférieur 87 (PI 87), franchissant la Route Départementale 112.

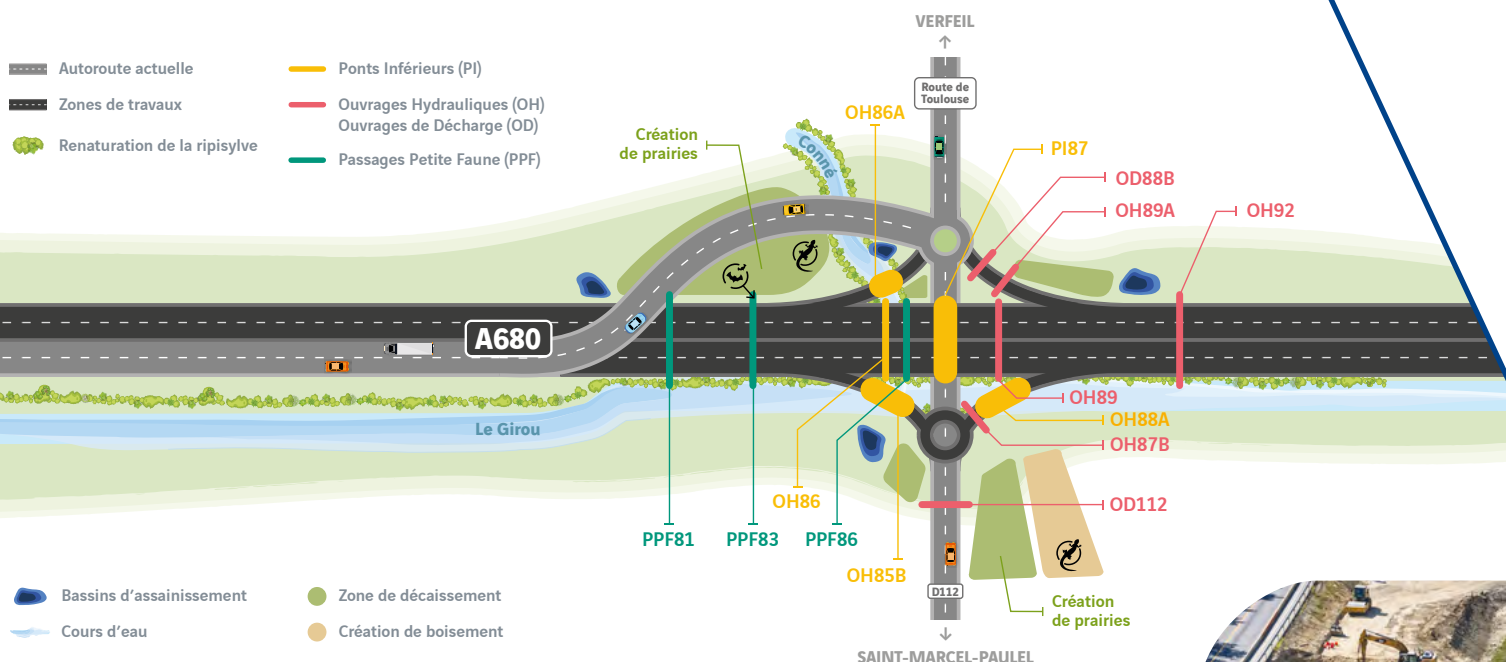

Le saviez-vous ?

Les aménagements dans les communes de Verfeil et Saint-Marcel-Paulel comprennent

10 ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques

3 bassins multifonction d'assainissement

et des aménagements environnementaux :

- 3 passages petite faune
- Des zones de compensation hydraulique
- Un abri pour les chiroptères
- Des plantations et travaux de génie écologique en faveur de la biodiversité



ON EN PARLE
JUSTE ICI !



L'avancement général des travaux

Plus généralement, sur le chantier de Verfeil, les équipes du groupement GTM Sud-Ouest sont mobilisées sur plusieurs zones simultanément :

1 Terrassement et préparation des nouvelles voies

Les travaux de terrassement sont en cours, avec notamment la montée des remblais qui serviront de support à la future chaussée. Les remblais de préchargement et opérations de consolidations des sols ont été réalisés préalablement.

2 Avancée des ouvrages d'art

Plusieurs ouvrages de transparence hydraulique sont en cours de travaux ou d'achèvement :

L'OD 112, un ouvrage cadre en béton armé situé sous la RD112, est terminé et mis en circulation depuis fin août.

L'OH86A, un ouvrage à trois travées enjambant le cours d'eau Conné, se termine. Son tablier, correspondant à la structure qui recevra la voie de circulation, a été construit cet été.

L'OH 85B, un ouvrage à trois travées enjambant le Girou, long de 110 mètres est en cours de construction.

3 Aménagements environnementaux

Les bassins d'assainissement, ainsi que les **décaissements à vocation hydraulique** en cas d'épisode pluvieux, sont en cours de réalisation. Ces dispositifs visent à limiter l'impact des travaux sur les écosystèmes locaux, tout en assurant une gestion efficace des flux d'eau.

Les travaux de **la création des passages petite faune**, ainsi que l'abri pour les chiroptères sont également en cours.

S'informer & nous contacter durant le chantier



Newsletter « Info Travaux »
● Inscription sur le site



Ligne directe
☎ 05 35 54 88 50
✉ contactA680@vinci-autoroutes.com



Site
a680-amenagement.com



Visitez le chantier
● Faites la demande sur le site



Service gratuit « Mon Bulletin Circulation »
vos conditions de circulation sur : mon-bulletin-circulation.vinci-autoroutes.com
